




Reporte de estatus semanal

Proyecto
Fecha


EVA Project Advisory
&
Scheduling



SEMANA 1 Proyecto



AVANCE
27%



TERMINACIÓN
04/01/22



DIFERENCIA
-7%

Cambios y avances en proyecto

02

Esta semana se concluyeron las actividades de terracerías, así como los de terraplén o subrasante. Igualmente se dio inicio a los trabajos de suministro y colocación base, avanzando un 90% solo en esta semana. Se espera poder realizar la impregnación de la base colocada el día de mañana.

Las tareas que han presentado avance esta semana son:

CONCEPTOS	%anterior	avance	%final
TERRACERIAS	90%	10%	100%
TERRAPLEN CON MATERIAL DE BANCO	0%	100%	100%
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE	0%	90%	90%

Puntos clave

- Se concluyen los trabajos de terracerías y terraplen.
- Se comienza la colocación de base hidráulica..
- Se programa la impregnacion para el día de mañana.



Aplicación de cal para homogeneizar la terracería.



Prueba de compactación




Construcción de terraplén.



Colocación de capa de base hidráulica.

Esta semana la ruta critica se encuentra en la tercera etapa del proyecto en su totalidad, tanto en su etapa "A" como "B".

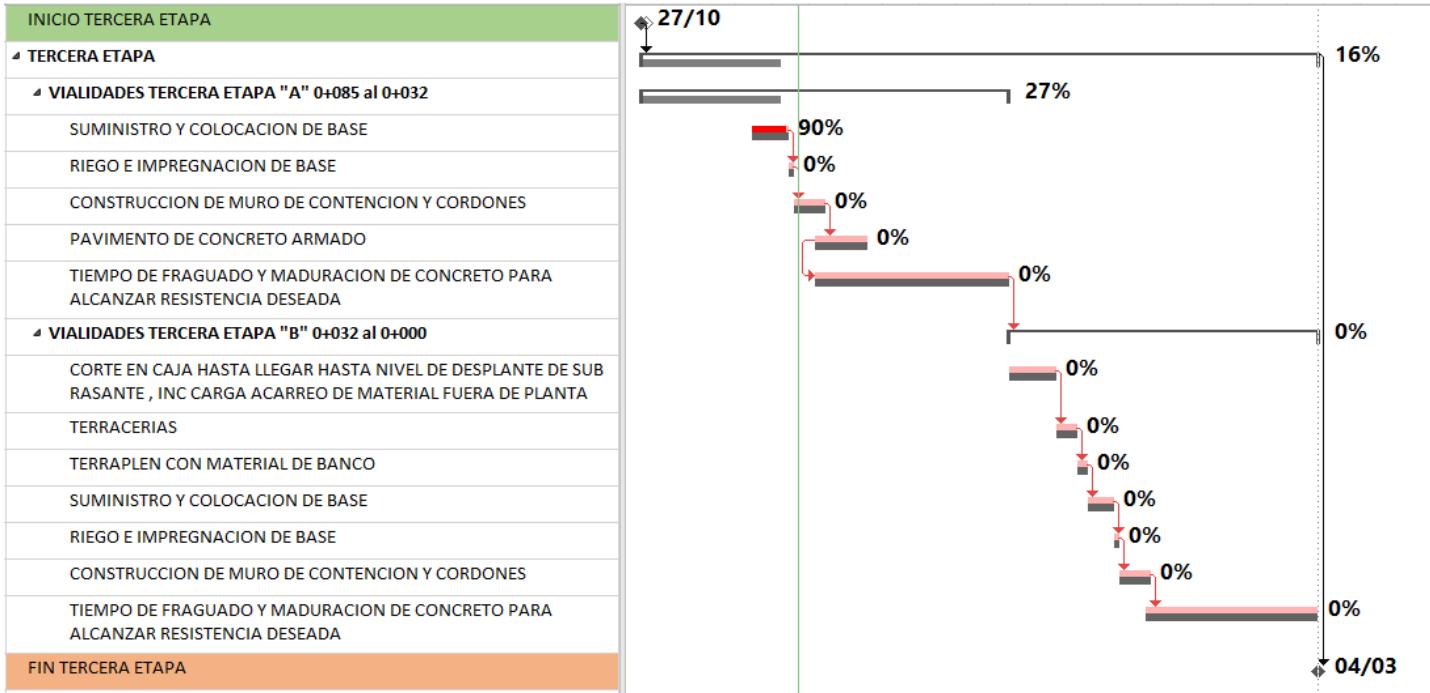

Por este motivo, se recomienda continuar con especial atención las actividades correspondientes a esta etapa del proyecto.

Estado General de la Ruta crítica: Monitorear

- Se detectan retrasos en las actividades de impregnacion de base hidráulica.

A continuación se muestran las actividades cuya diferencia entre sus porcentajes de avance real y programado pueden terminar afectando el avance general y por lo tanto, la fecha de terminación del proyecto

Actividad	%Real	%Programado
INSTALACION DE TUBERIAS CONTRA INCENDI, AGUA Y ENCOFRADO ELECTRICO FUTURO	80%	100%
SUMINISTRO Y APLICACION DE COMPUESTO ANTITERMITA	0%	40%
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE	90%	100%
RIEGO E IMPREGNACION DE BASE	0%	100%

Estado General de retrasos: Monitorear


- Hay 1 actividad retrasada dentro del proyecto por encima del 50% de retraso.

Análisis gráfico

08

Se presentan las siguientes graficas para ilustrar de manera mas descriptiva el estatus actual y futuro del proyecto.

- Como se puede apreciar el proyecto durante su tercera etapa es poco propenso a los cambios bruscos de avance, siendo las unicas curvas pronunciadas las presentes en las semanas 6 y 15 del proyecto

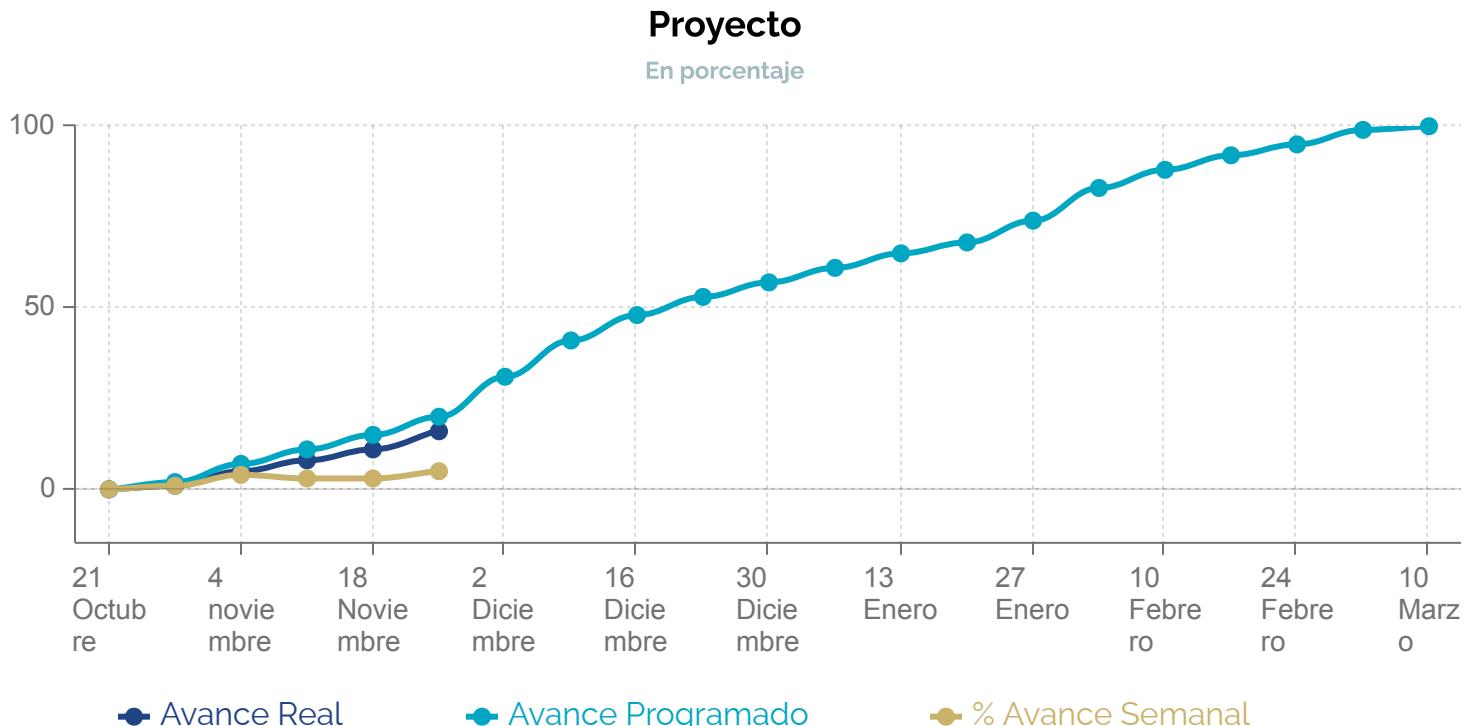

Proyecto
PORCENTAJES TOTALES



■ % Real 16
■ % Programado 20
